


• beliris •
POUR BRUXELLES
VOOR BRUSSEL



Réaménagement de la
place Royale et sa mise
en lumière

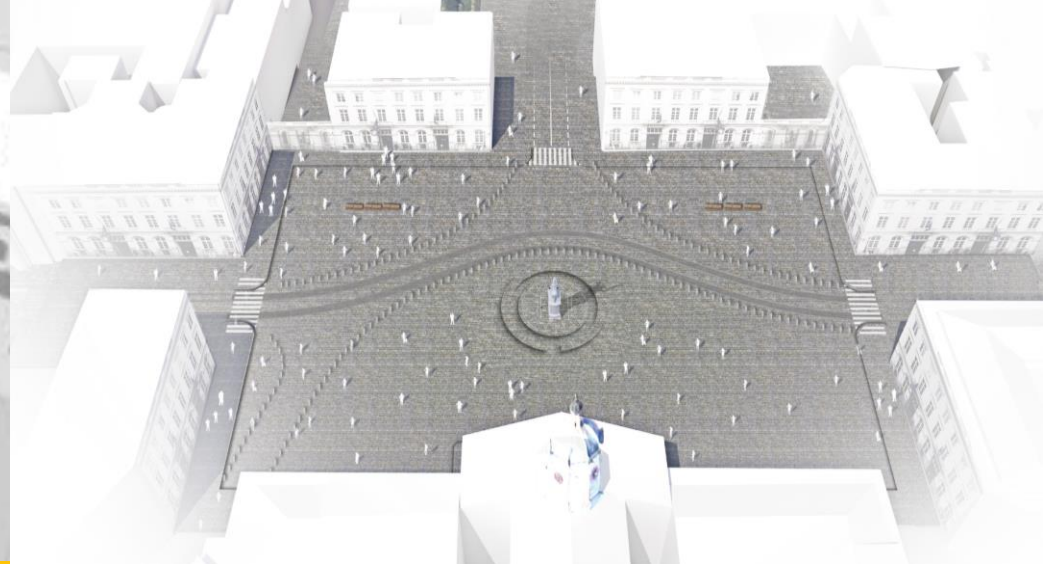

Le Projet

Aménagement de la place Royale **ET**
La mise en lumière du quartier Mont des Arts


La restauration de la Place Royale avec le plus grand respect pour son cadre historique classé



Restauration de l'étanchéité du Palais du Coudenberg




Réutilisation optimale des matériaux




Transformation du principe de « rond-point » en une bande de circulation mixte double sens



Installation de mobilier

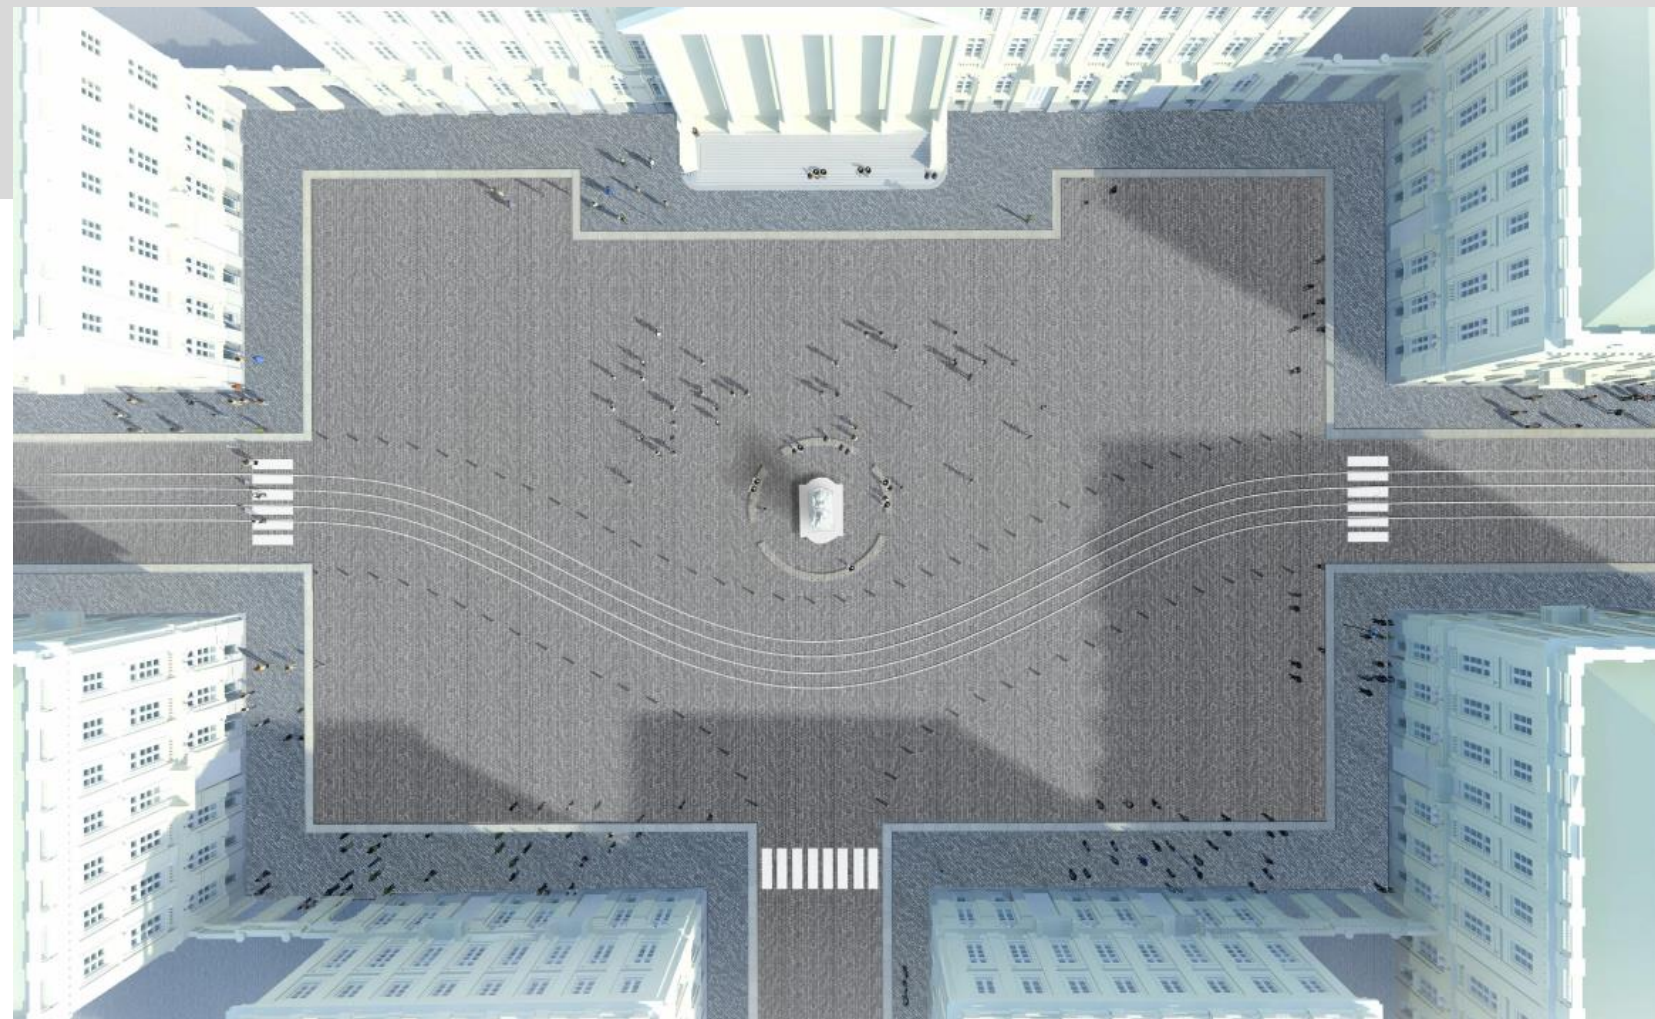

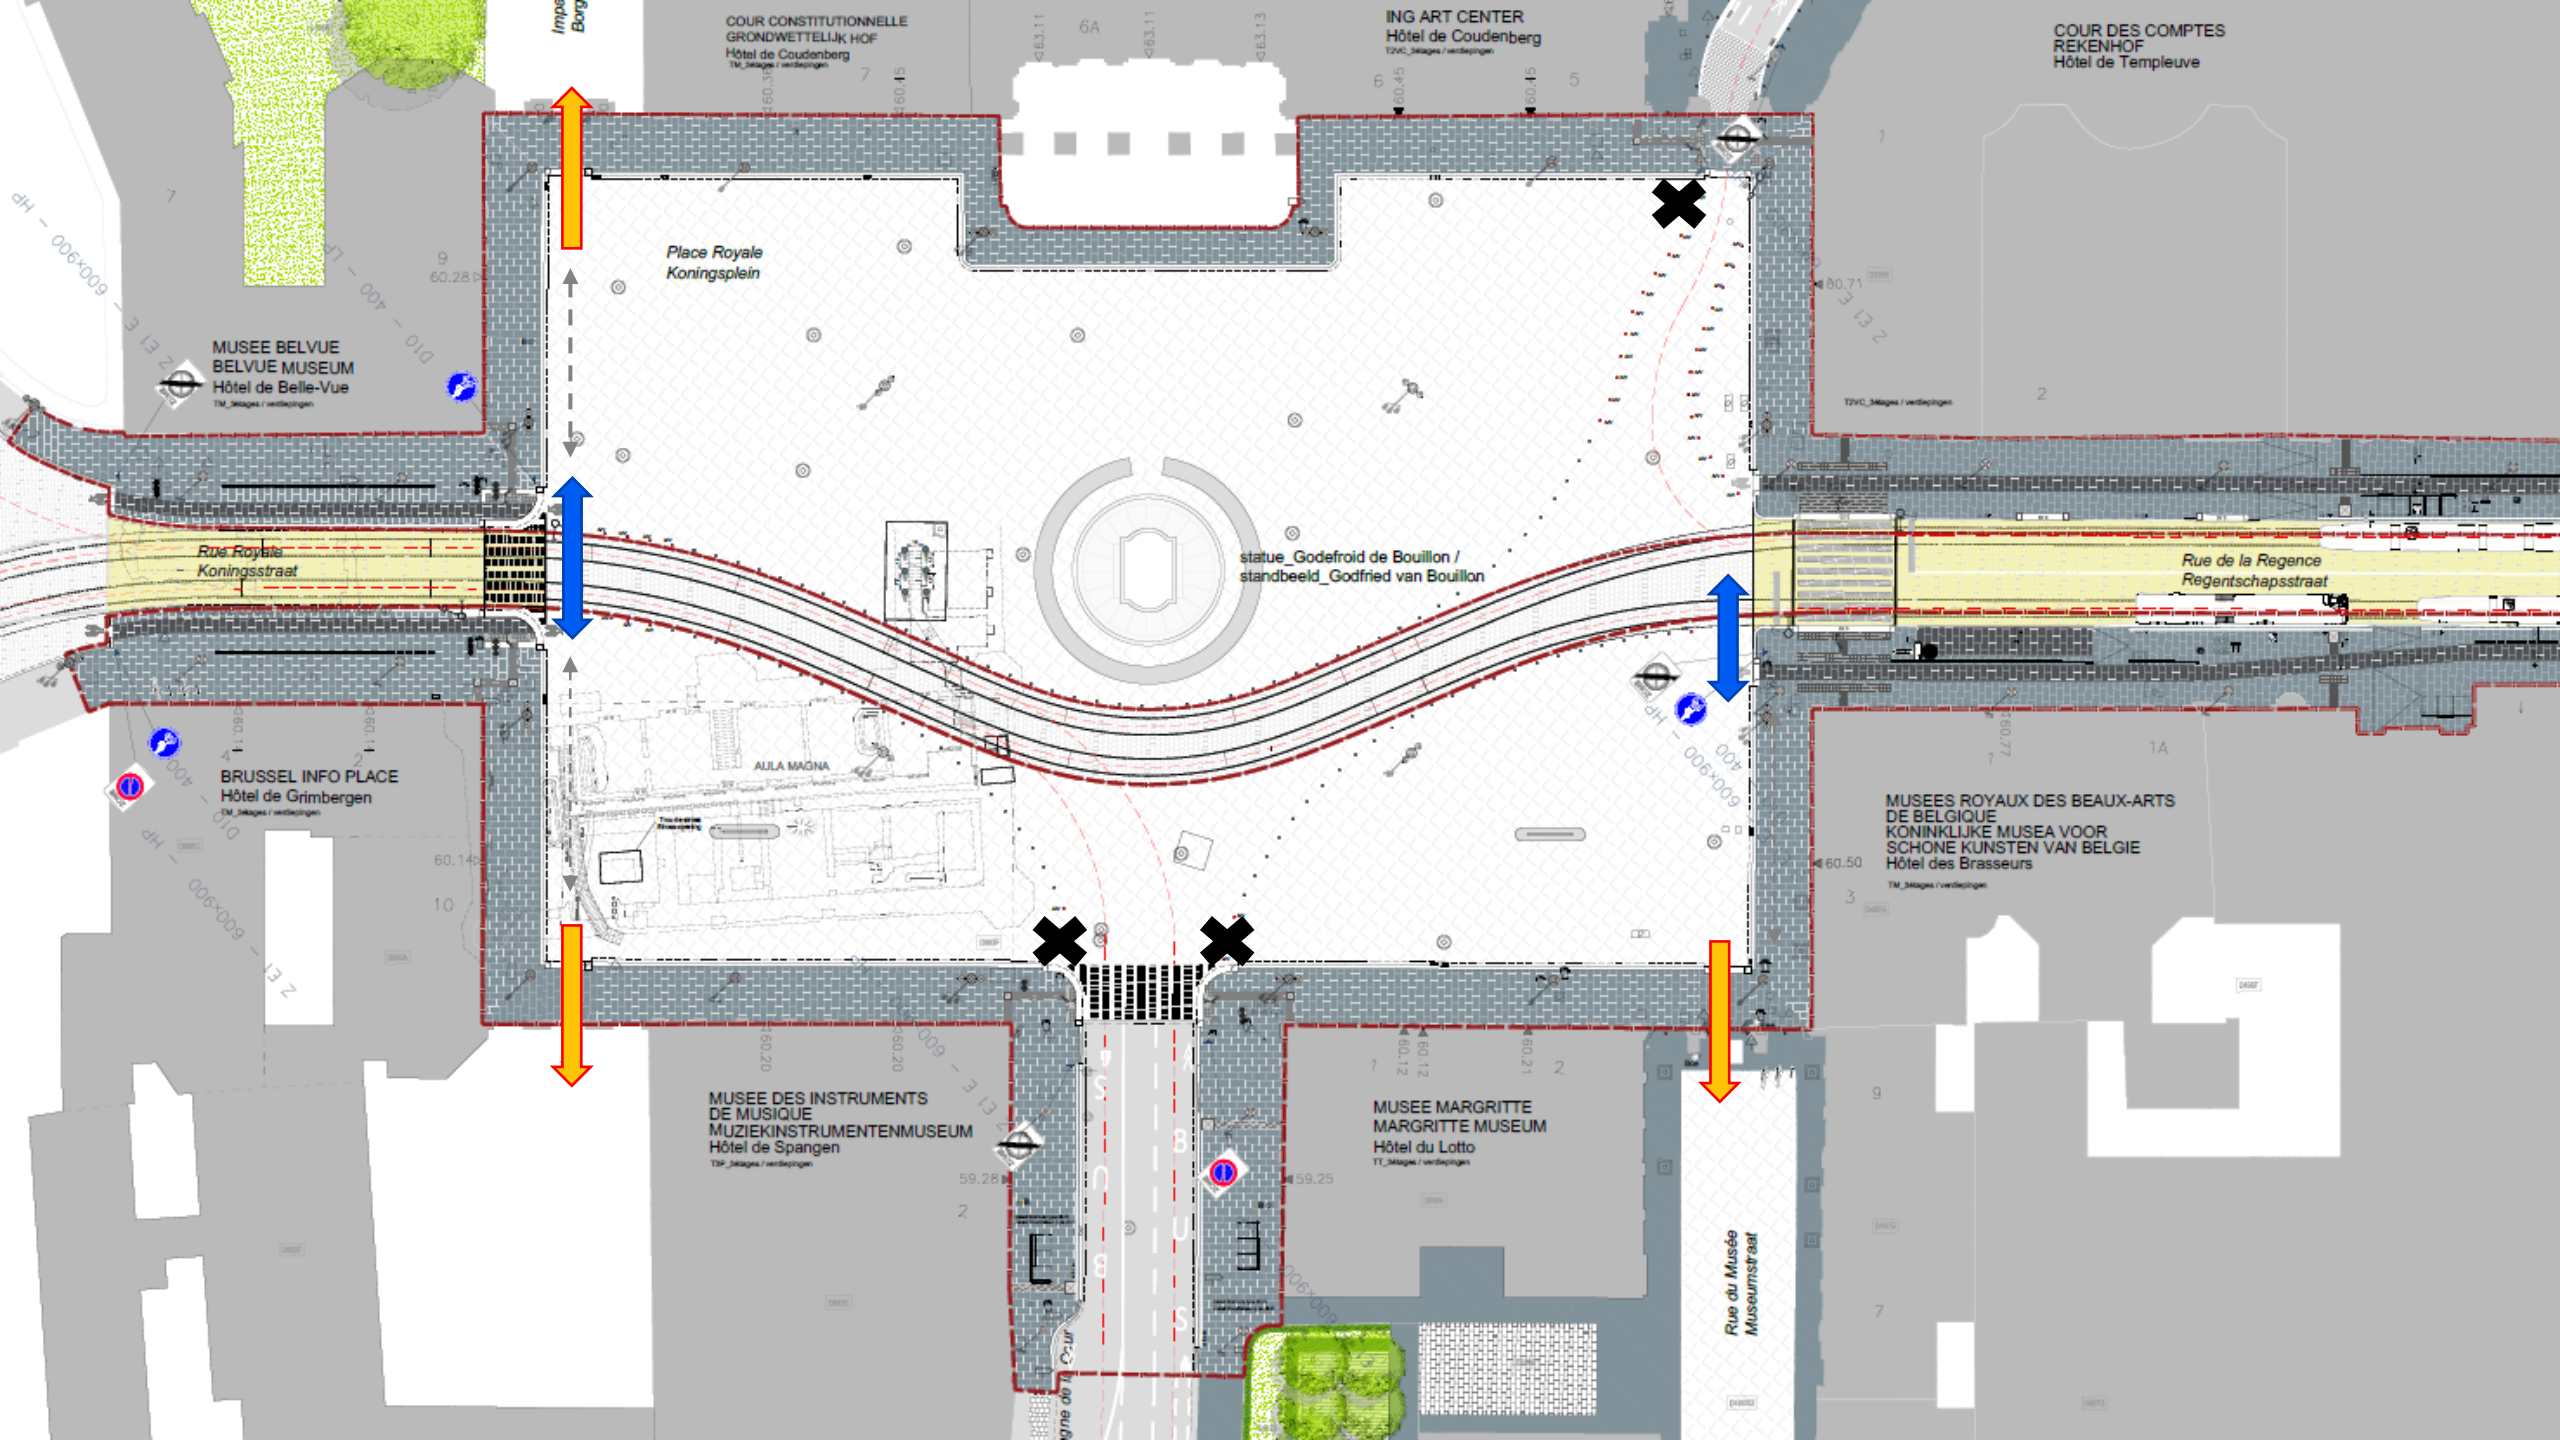

Place Royale
Koningsplein

statue_Godefroid de Bouillon /
standbeeld_Godfried van Bouillon

MUSEE DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM
Hôtel de Spangen

MUSEE MARGRITTE
MARGRITTE MUSEUM
Hôtel du Lotto

MUSEE BELVUE
BELVUE MUSEUM
Hôtel de Belle-Vue

BRUSSEL INFO PLACE
Hôtel de Grimbergen

MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS
DE BELGIE
KONINKLIJKE MUSEA VOOR
SCHONE KUNSTEN VAN BELGIE
Hôtel des Brasseurs

ING ART CENTER
Hôtel de Coudenberg

COUR DES COMPTES
REKENHOF
Hôtel de Templeuve

Rue Royale
Koningsstraat

Rue de la Regence
Regentschapsstraat

Rue du Musée
Museumstraat




Travaux/Phasage


Travaux STIB: 16/10 jusqu'au 05/11



Phase 1

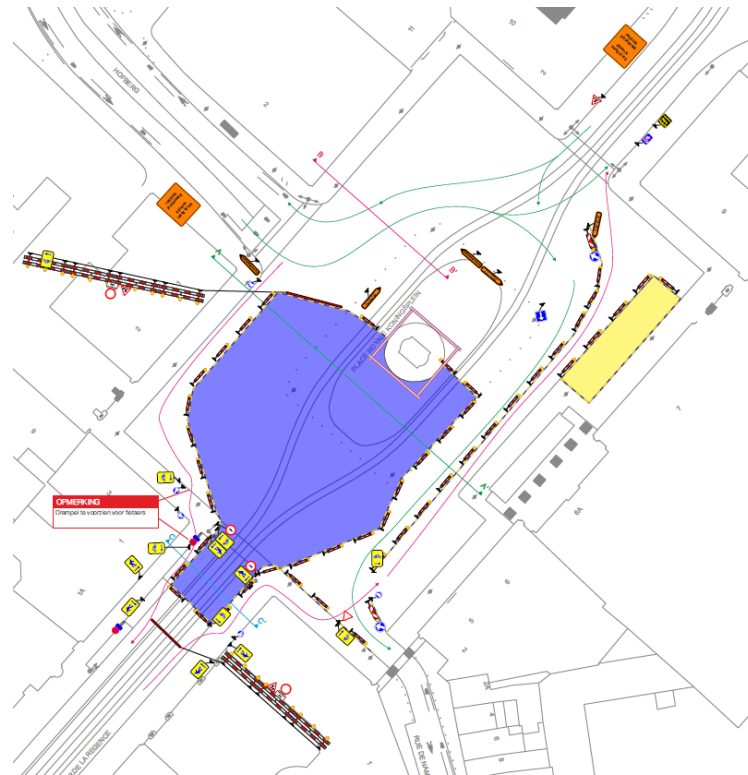


Phase 2

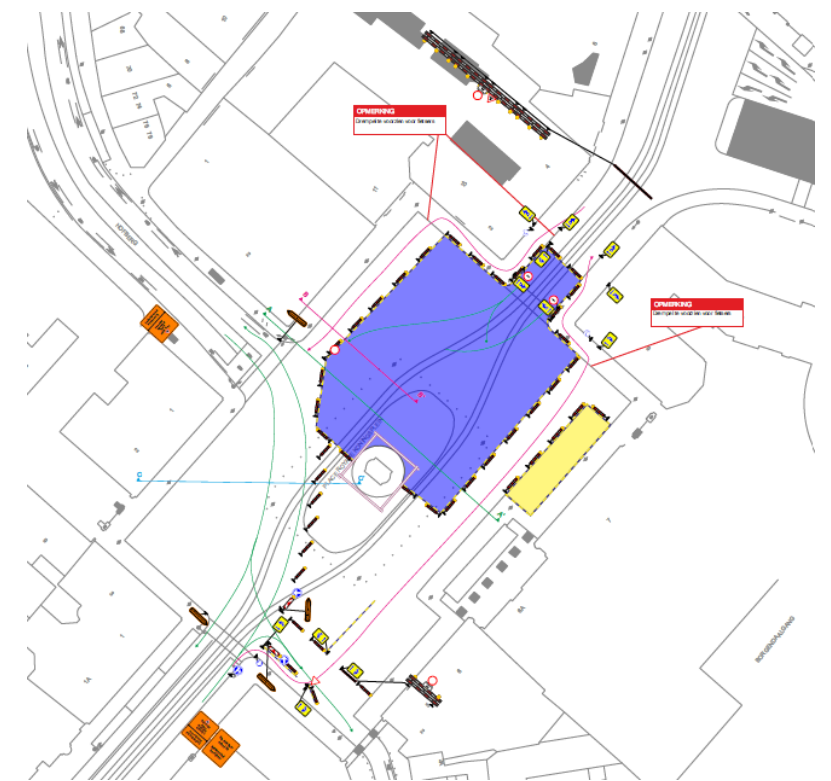

Phase 3

Travaux BELIRIS



2024/2025: Organisation en phases

(voir INPUT SOUSMISSIONNAIRE)

Délai:
**465 jours
ouvrables**

Les travaux sont divisés en « quadrants » et « zones » suivantes :

- quadrant St Jacques (double quadrant) - **130 jours ouvrables**
- quadrant MRBA - **65 jours ouvrables**
- quadrant BIP (Aula Magna) - **130 jours ouvrables**
- zone centrale de la Place royale - **65 jours ouvrables**
- zone Régence - **65 jours ouvrables**
- zone Royale - **65 jours ouvrables**
- zone Rue et Place du Musée - **40 jours ouvrables**
- zone Montagne de la Cour - **40 jours ouvrables**



Travaux BELIRIS



Début 2024:


Saint-Jacques-sur Coudenberg et Aula Magna

**Délai:
2x 130 jours
ouvrables**

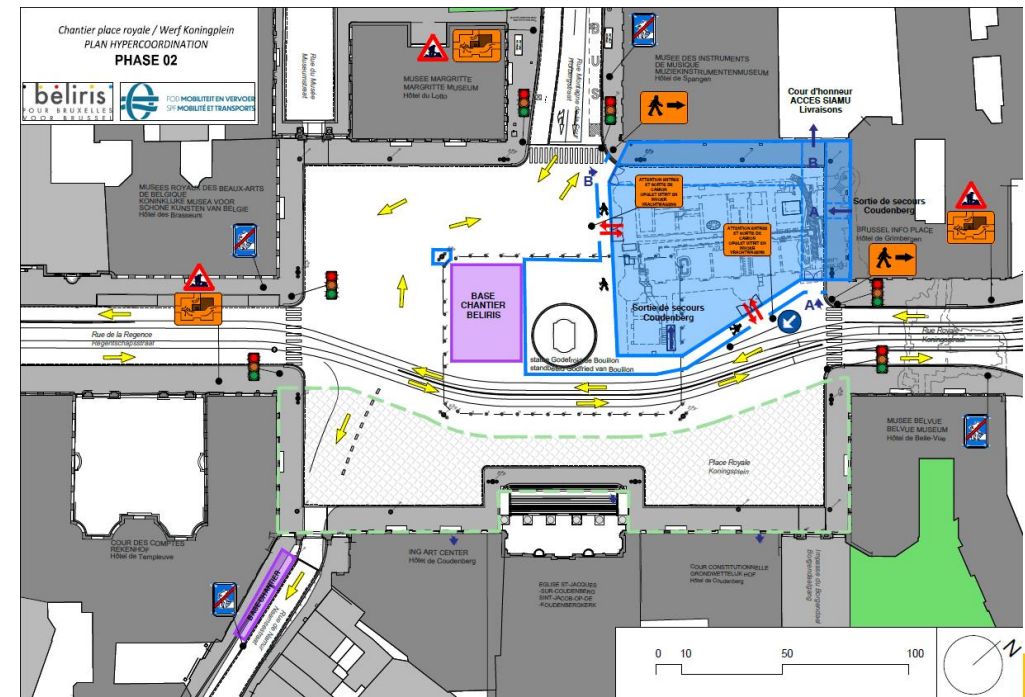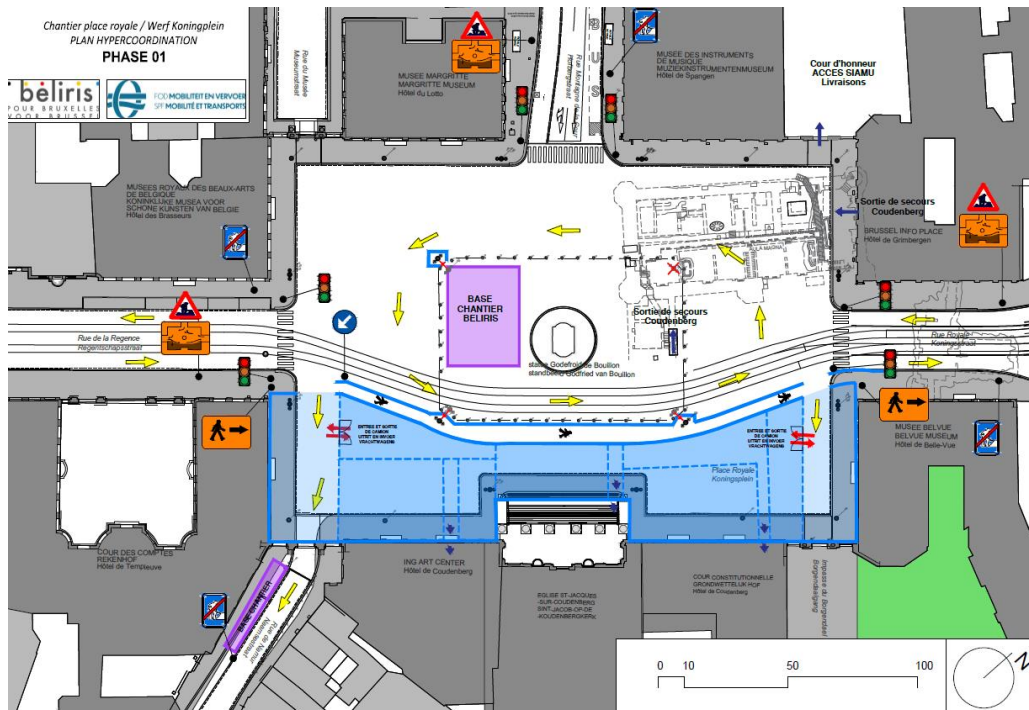




Phase: Saint-Jacques-sur Coudenberg

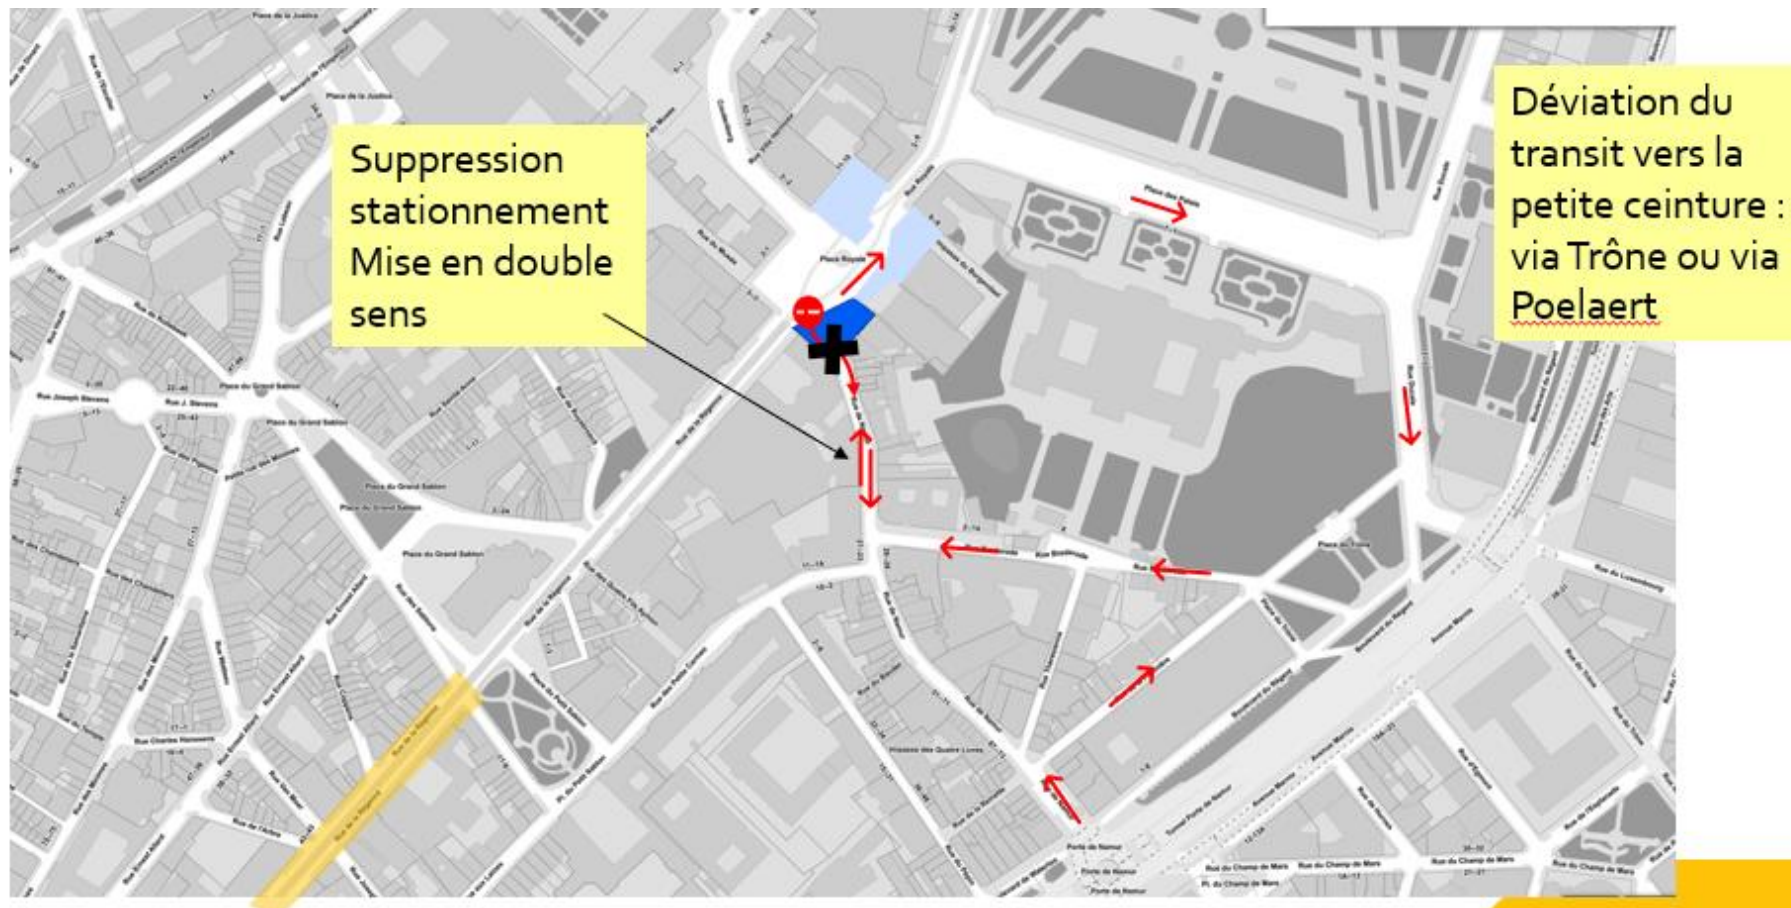

- Déviation par la Rue de Brederode
→ déviation déjà mise en place pour le chantier Vivaqua 2022


Travaux STIB fin 2024

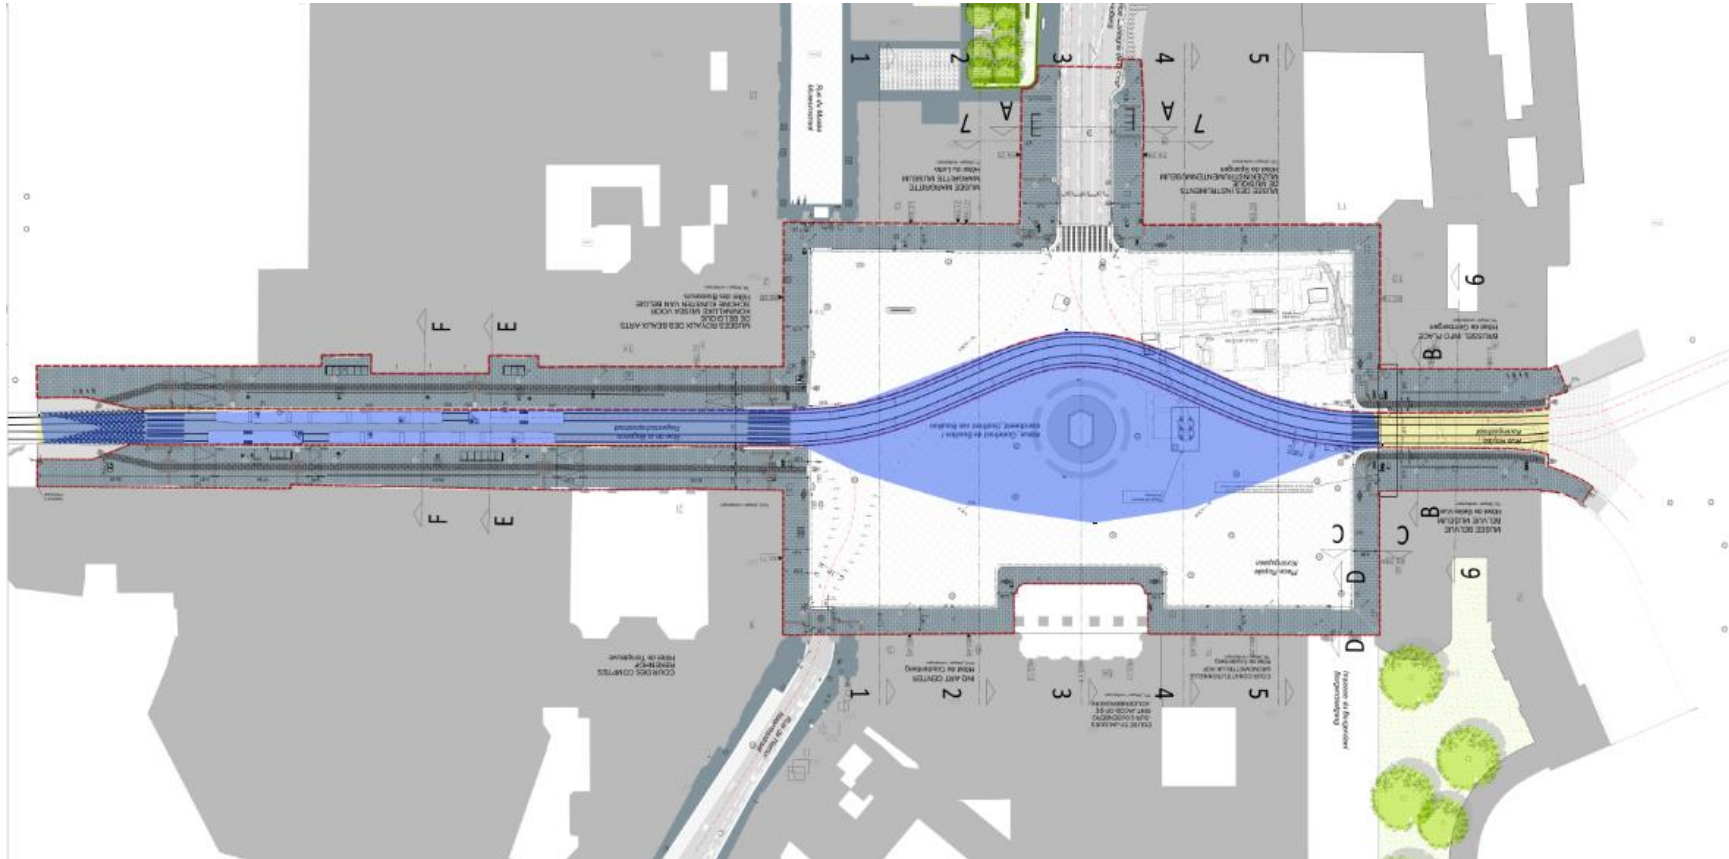

Voies DEFINITIVES

- Nouvelles voies côté Montagne de la cour
- Suppression des voies côté St-Jacques


Travaux BELIRIS



2025

Phase: MRBAB, rue du Musée et place du Musée

**Délai:
40 + 65 jours
ouvrables**

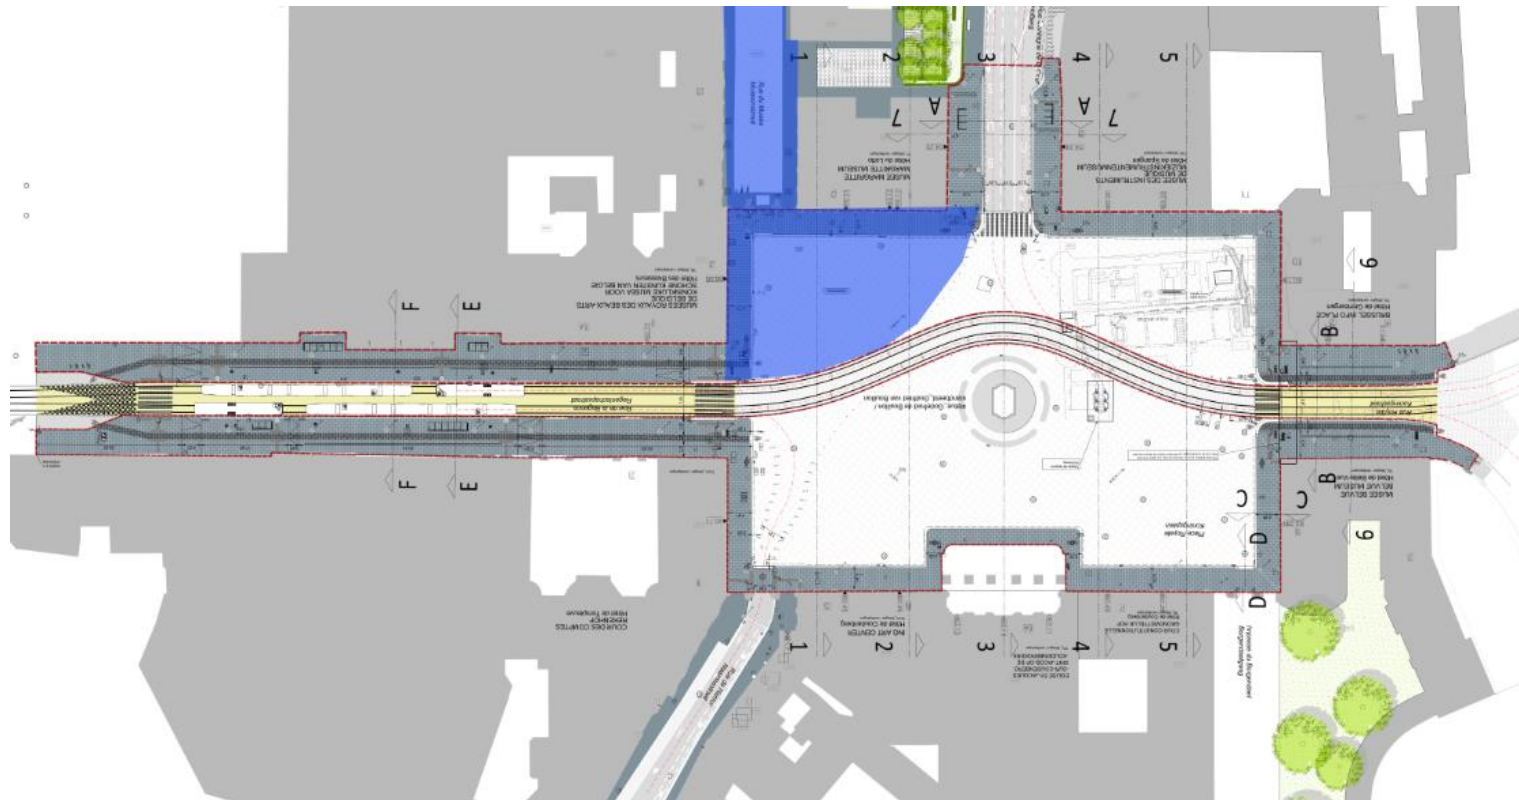


Travaux BELIRIS



2025

**Phase: Rue de la Régence :
réalisation des arrêts « Royale »**

**Délai:
65 jours
ouvrables**

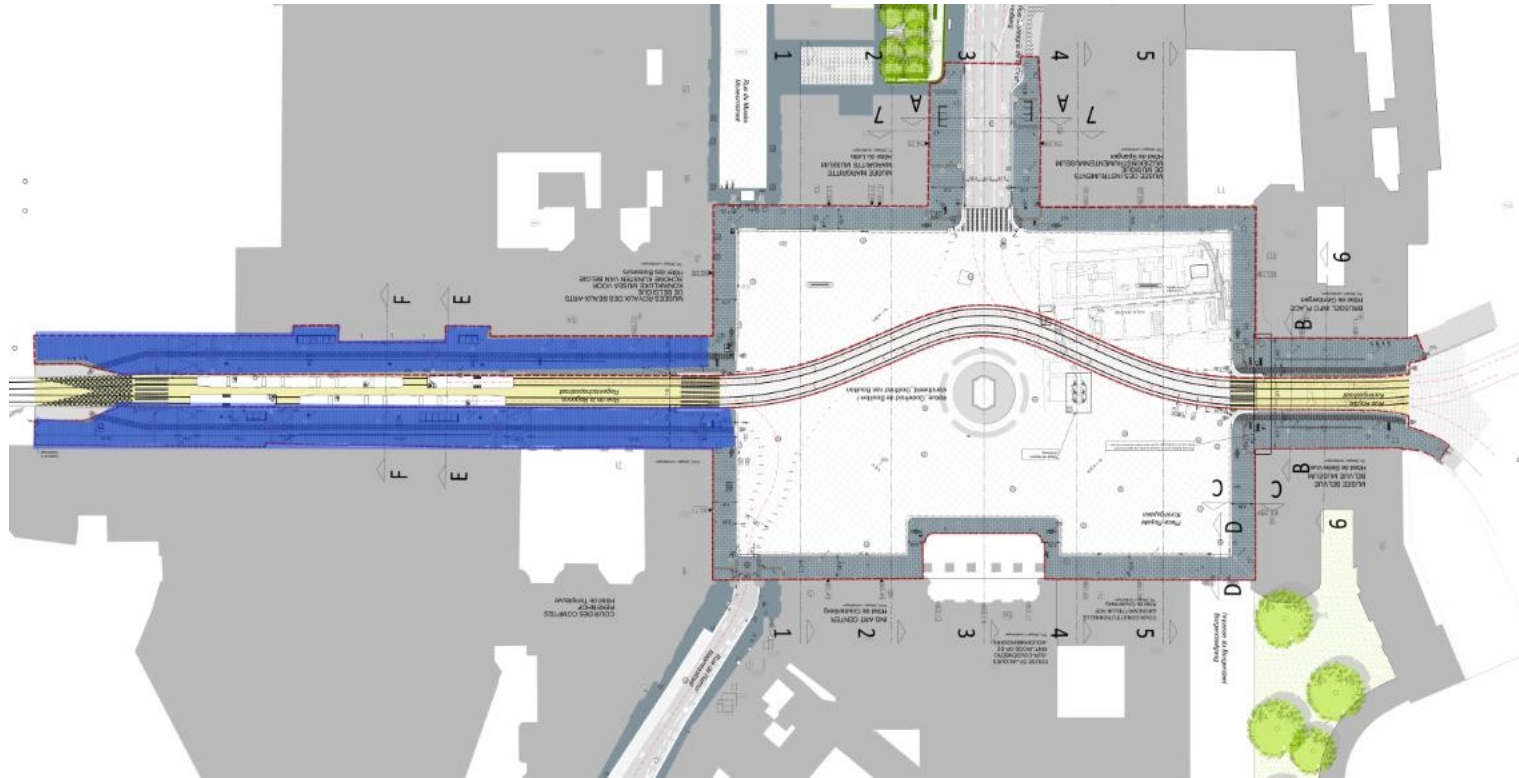


Travaux BELIRIS




2025

**Phase: Finalisation du centre de la place
après le retrait des rails provisoires**

**Délai:
65 jours
ouvrables**

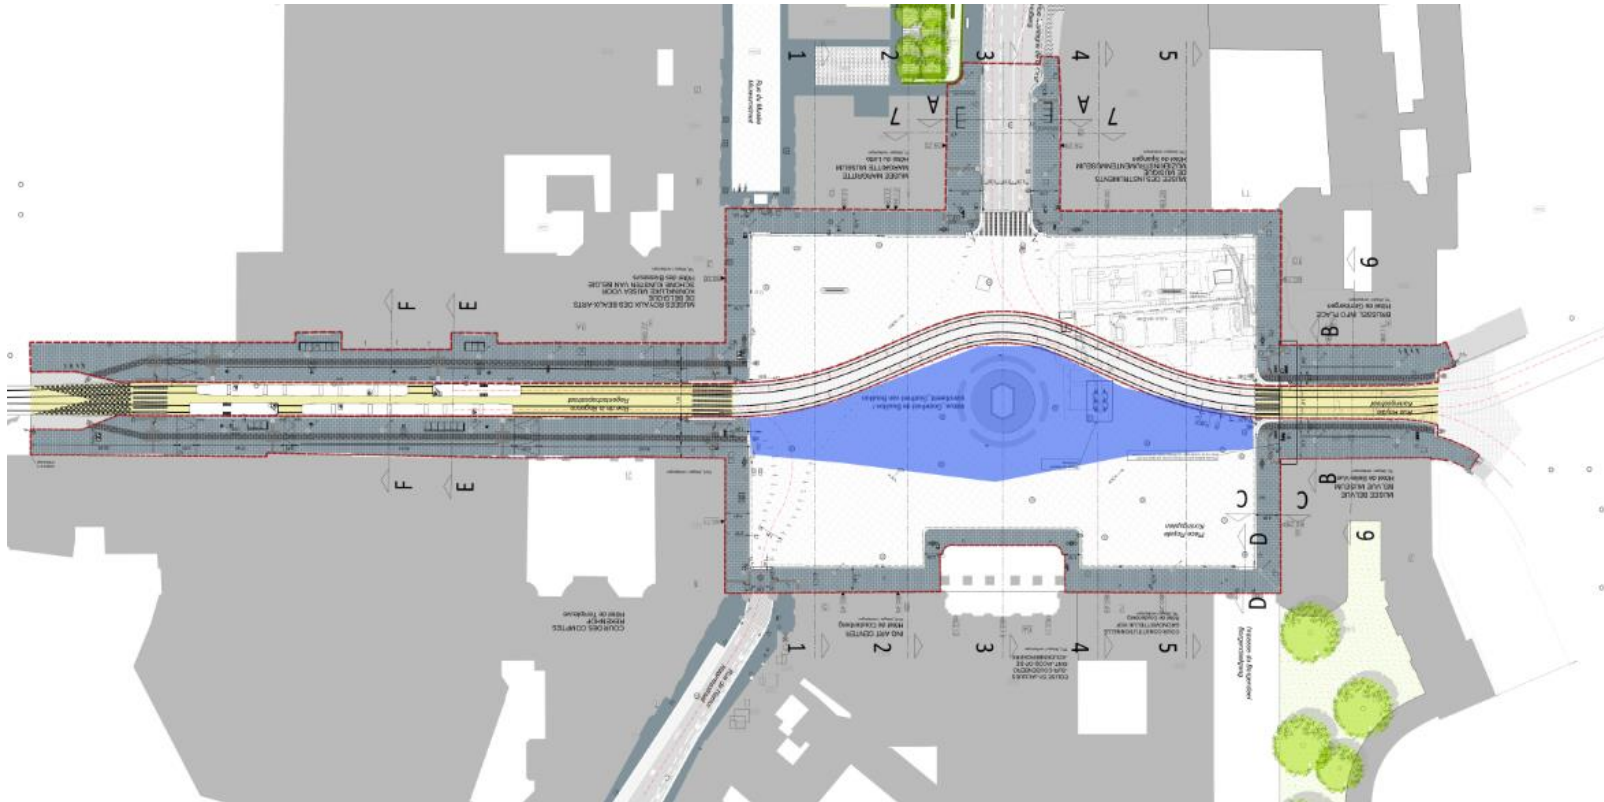



Travaux BELIRIS



2025

Phase: Finalisation des zones de raccords

Délai:
40 jours ouvrables
+inclus dans le délai
global

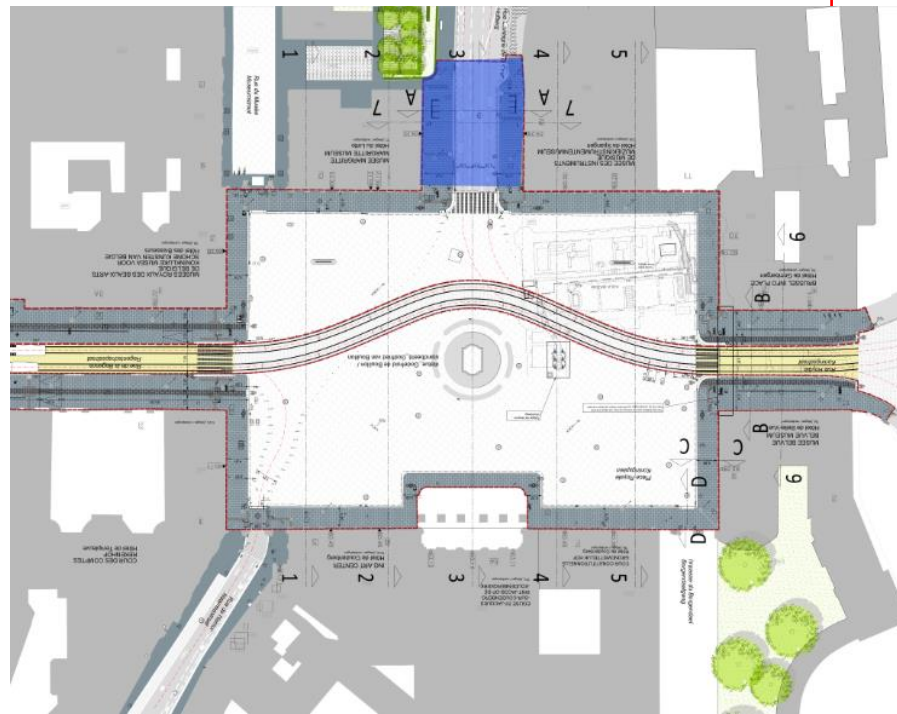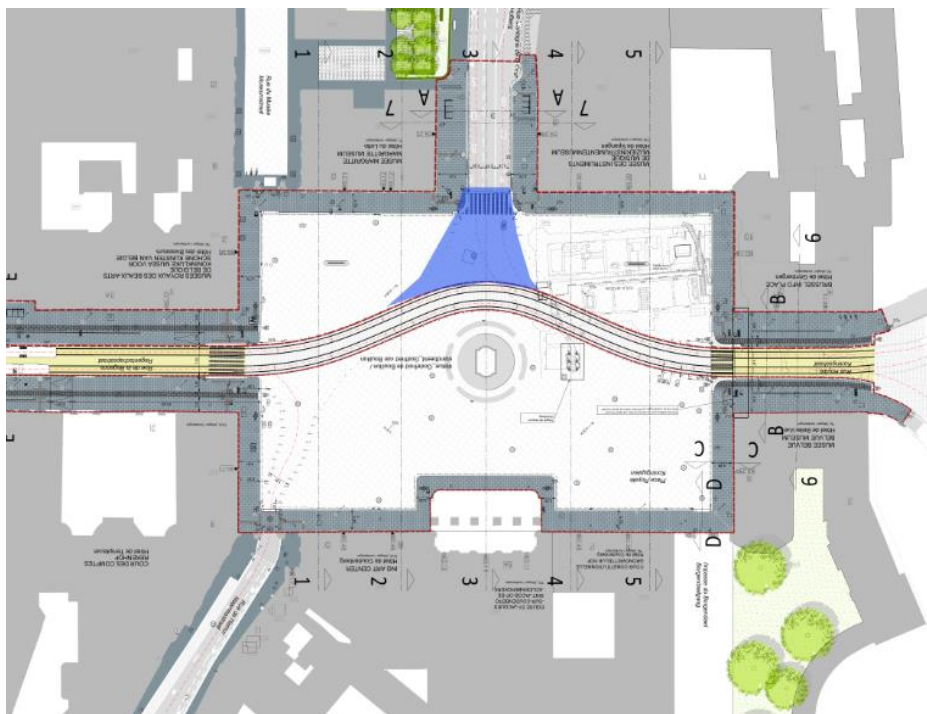


Travaux BELIRIS



2025

Phase: Goulet Royale
Réfection de l'étanchéité du Corps de Logis

Délai:
65 jours
ouvrables

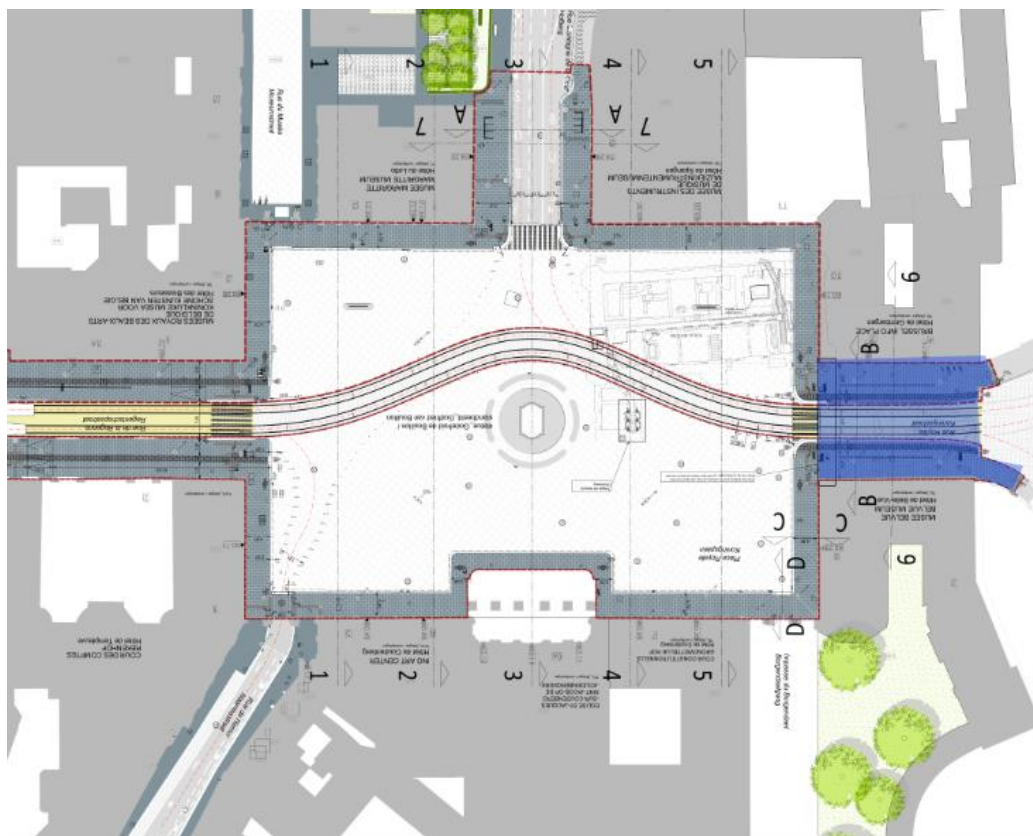

Déviations à reprendre
de la déviation mise en
place préalablement par
la STIB



RECAP:

Phase préparatoire (STIB/concess):


3 semaines (16/10/23 - 05/11/23)

Phase Travaux:

+/-2 ans (2024-2025)

→ Lancement phase 1 ou 2

→ Reste des différentes phases à coordonner en fonction des autres chantiers et planning entreprise



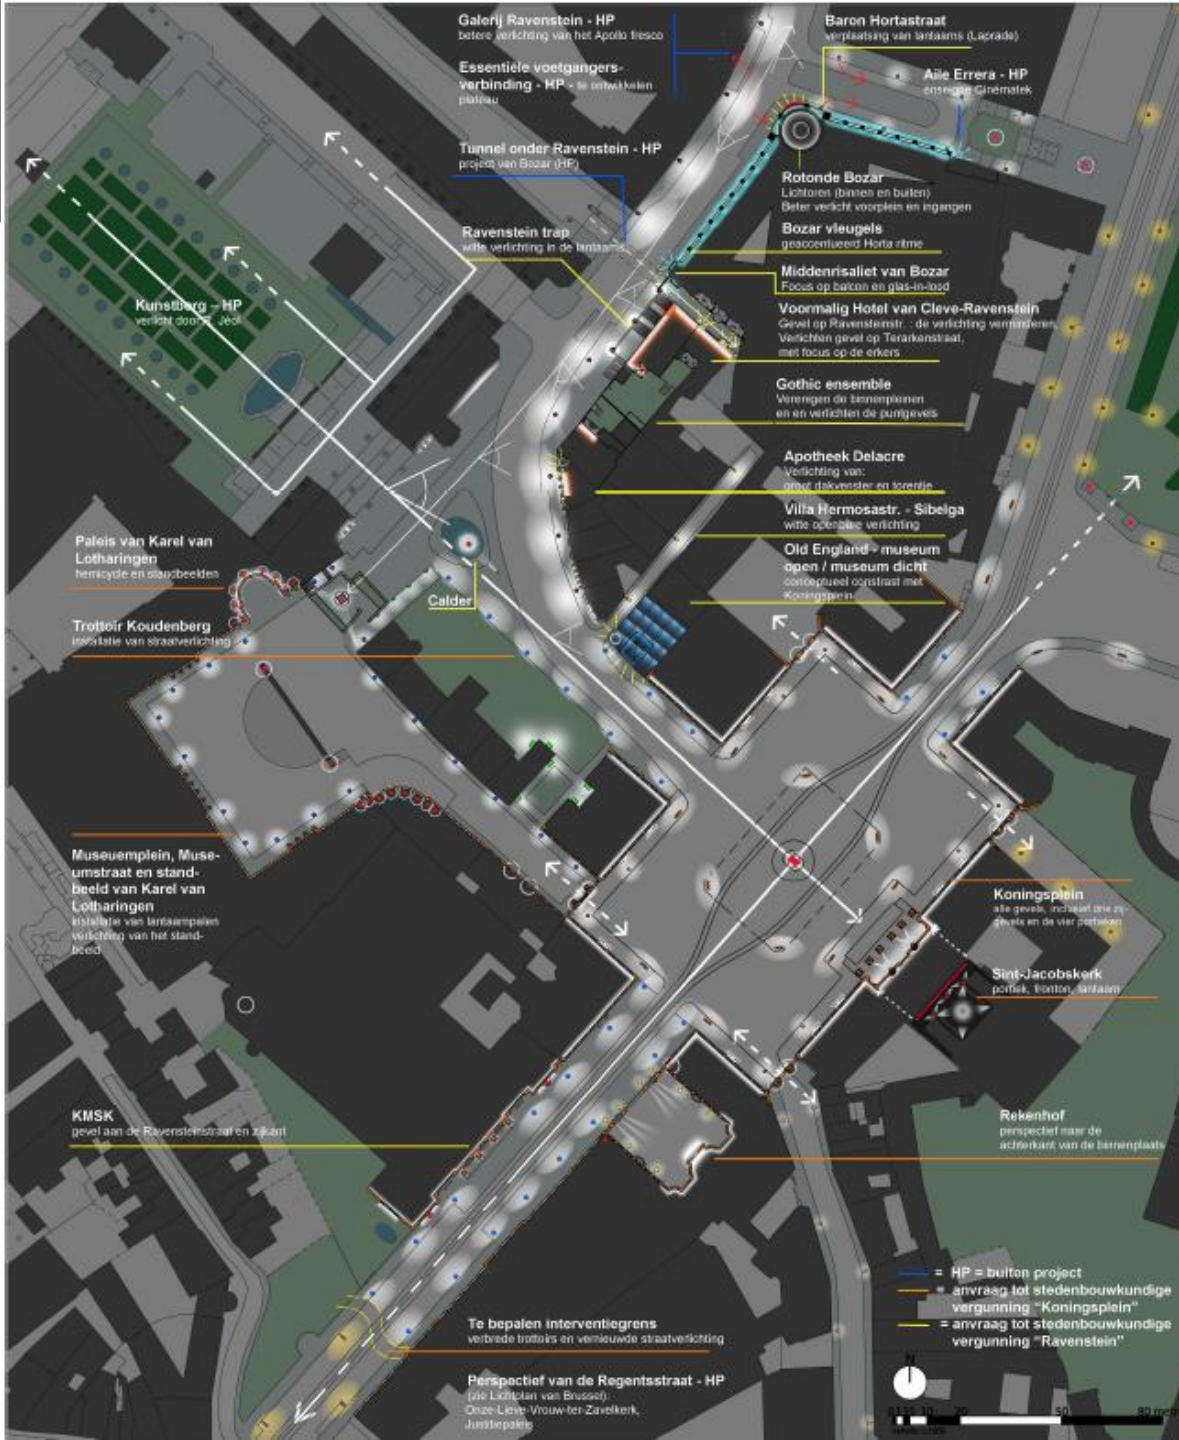




Illuminations:
 - Bâtiments
 - Espace public



- **Eclairage scénographique :**
 - Les façades de la place Royale et l'éclairage de la place du Musée (ensemble néoclassique)
 - **permis « Place Royale »**
 - Gestionnaire : ville de Bruxelles avec un contrat d'entretien spécifique (Sibelga)
 - Autorisation de travaux à conclure avec les propriétaires

 - L'éclairage scénographique d'ensembles remarquables le long de la rue Ravenstein et de la rue de la Régence (MIM, maisons rue Ravenstein, Bozar + Cour des Comptes et MRBA)
 - **Permis dit « Ravenstein »**
 - Gestionnaires : Ville de Bruxelles et Régie des Bâtiment

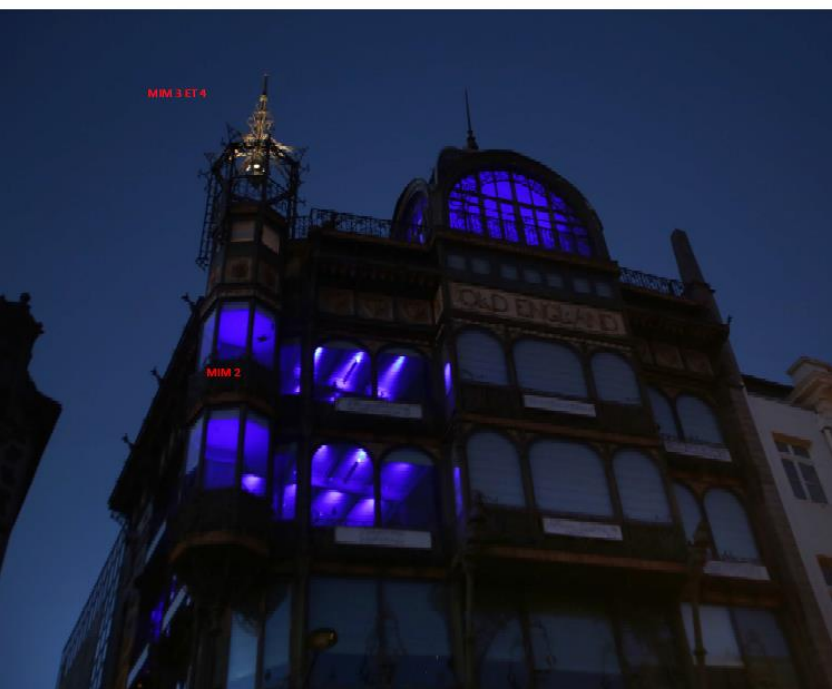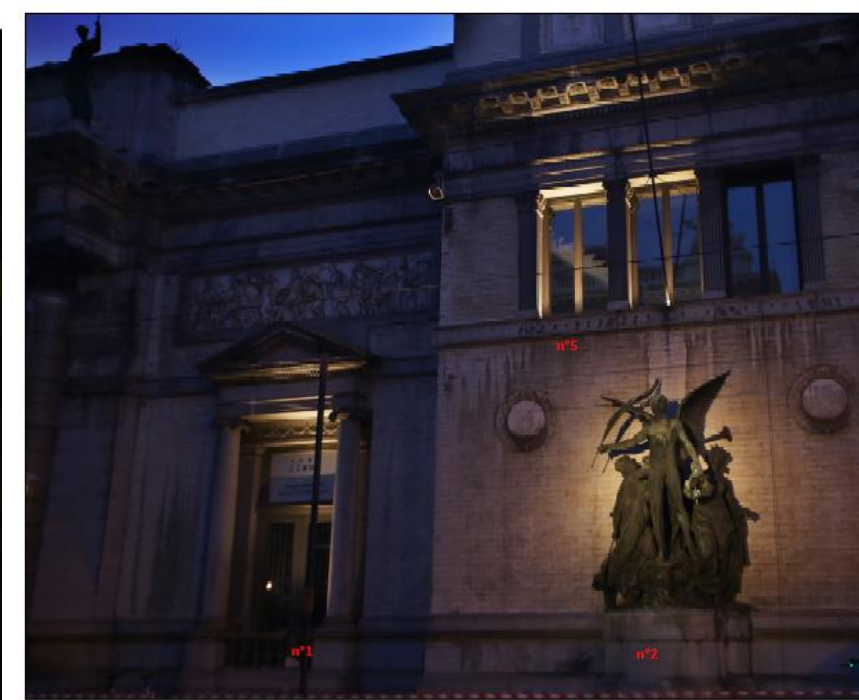

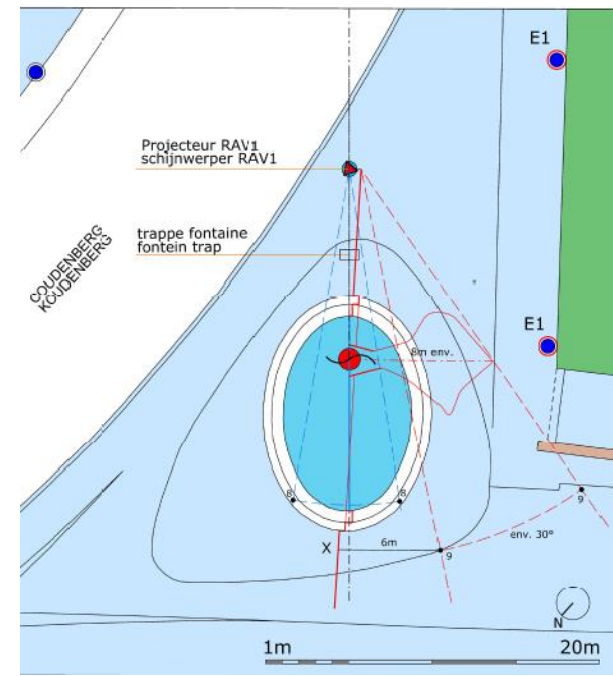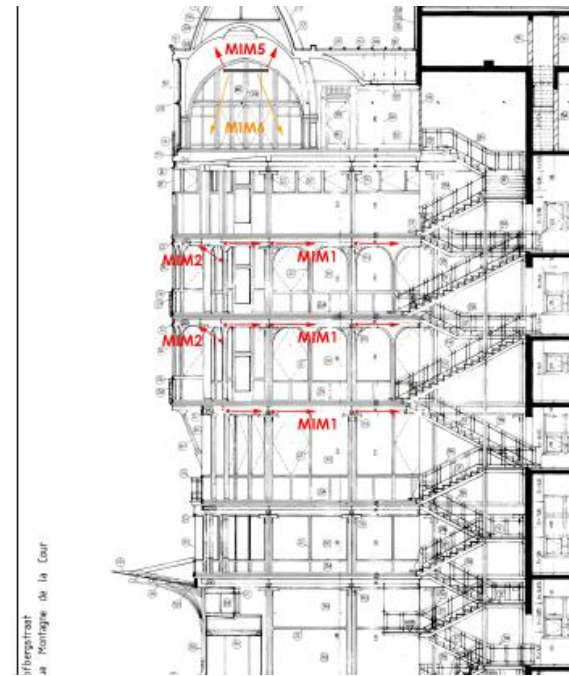



Convention

D'autorisation de travaux **et
entretien des installations par la Ville**

- Sera soumise à tous les riverains pour signature
- Collaboration/coordination des travaux
- Nettoyage des façades?

Planning



▪ **Permis d'urbanisme obtenu pour l'ensemble**

- La partie Ravenstein
(Illuminations: Bozar, Hotel Ravenstein et env. MIM et MRBAB)
- La Place Royale
 - Aménagement espaces publics
 - Illuminations de la place Royale

! STIB introduit permis modificatif pour partie Régence



▪ **Etudes & Travaux:**

- Espace public: Attribution de marché
 - Démarrage travaux prévu: Début 2024
- Illuminations: CSC en cours
 - Travaux 2024/2025



Communication



- **Ombudsman Beliris**
Simon Vanderbemden
info.beliris@mobilit.fgov.be
- **Ombudsman entreprise**
→ Sera communiqué
- Réunions info riverains
- Leaflets
- ...

Contacteer ons
per telefoon



Fin

